

INTERNAL MEMO OFFICE

Nomor	:	Memo/PMO/2025/IX/160
To	:	Rudy Eddywidjaja, Karim Siregar, Sudjono, Goklas, Iwan
Cc	:	Hariman Nugraha, Riko Armanda, Syamsi Kusyanti, Kwan Sun An Antony, Desliana Sidabutar, Lisa Gunawan, Tania Febrina, Donny Patrick Manik, Aldo Susanto, Lim Rudi
From	:	Praditta Syifa Desvi & Evi Kristiana
Date	:	29 September 2025
Subject	:	Memo Implementasi Pilot Project Bravo PBF

A. Latar Belakang

1. Implementasi Project Bravo PBF dengan LOS Salesforce di 22 cabang PBF
2. Perlu adanya proses pre-implementasi melalui pilot di cabang dengan tujuan scale up proses bisnis yang terintegrasi dari leads management, credit approval, legal proses dan proses gilive secara end to end.
3. Product PBF sebagai product BFI pertama yang mengimplementasikan R3 sebagai ekosistem Core System BFI beserta proses migrasi R1 ke R3.

B. Tujuan

1. Terlaksananya Implementasi dan migrasi Project Bravo PBF dengan menggunakan R3 sebagai core system BFI.
2. Menjelaskan scope dan tahapan implementasi pada cabang pilot.
3. Menjelaskan Risk Acceptance Criteria (RAC) dalam Project Bravo PBF.
4. Menjelaskan Platform terkait yang digunakan pada Project Bravo PBF.
5. Memberikan gambaran business proses dari proses pengajuan aplikasi sampai dengan funding.
6. Menentukan produk pembiayaan (POT atau Paket) yang tepat sebagai strategi marketing dalam Project Bravo PBF.
7. Menjelaskan tugas dan tanggung jawab setiap PIC.
8. Menjelaskan tentang proses dan dokumen terkait prior to approval dan prior to funding.
9. Memberikan gambaran ketentuan terkait yang berhubungan dengan Business As Usual (BAU) atau system existing.

C. Scope dan Tahapan Implementasi

	MVP 1	MVP 2	MVP 3
Periode	Okt - Des 2025	Januari - Maret 2026	April - May 2026
Cabang Implementasi	Wave 1 : BSD dan Bintaro Wave 2*) : Bertahap All Branch	All Branch	All Branch
Product Implementasi	1. Refinancing 2. PRK**	1. KPR 2. Multi Agreement	1. Investasi - Konstruksi 2. Multi Collateral
Customer Type	Personal New & RO Company New	Personal New & RO Company New & RO	Personal New & RO Company New & RO
SOA	Direct Selling ,Agency, DMTM, Digital	Direct Selling, Integrated Digital, Agency, DMTM, dan CNO	Direct Selling, Integrated Digital, Agency, DMTM, dan CNO

*)Implementasi nasional pada Wave 2 dilakukan bertahap, berdasarkan sesuai hasil review implementasi Wave 1

**)On Progress Development PRK

Ketentuan Scope dan Implementasi

1. Penggunaan salesforce diprioritaskan dalam proses input leads sampai dengan proses approval dan funding selama masa implementasi, Adapun mitigasi apabila terdapat hambatan akan dilakukan penginputan ulang menggunakan R1 untuk proses input leads sampai dengan funding.
2. Implementasi pada tahap awal dilakukan di cabang BSD dan Bintaro, dan selanjutnya masih dalam MVP yang sama akan dilakukan pada cabang PBF lainnya secara bertahap.
3. Product pada tahap awal yang diimplementasikan adalah Refinancing dan untuk selanjutnya akan diimplementasikan PRK dalam periode MVP 1

D. Timeline Implementasi MVP 1

Activities	Timeline Project	Detail
Training For TaskForce	30 Sep 2025	Proses Bisnis BAU
Training for TF, End User HO & End User Branch	Okt 2025	Proses salesforce & surrounding squad
Pilot Implementation - Wave 1	Okt - Nov 2025	Cabang BSD dan Bintaro***
Pilot Implementation - Wave 2	Nov - Des 2025	Implementasi bertahap All Branch***
Enhancement Training Product PRK)*	Nov 2025	TF, All Branch, HO
Implementasi Piloting PRK	Nov 2025	Implementasi setelah development dan Pass QA)**
Review dan Monitoring	Okt - Des 2025	All Branch
After Care Session	Des 2025	All Branch
Hand Over)**	Des 2025	

)***On Progress Development PRK

)**T/C sesuai hasil review implementasi piloting

*** Migrasi kontrak dari Confins R1 ke R3 + surrounding squad tidak boleh dilakukan selama bulan Desember

E. Ketentuan RAC

RAC mengikuti ketentuan PBF sesuai dengan BAU


F. Platform Bravo PBF

Pada Project Bravo PBF yang terlibat dalam proses bisnis, operation & collection akan menggunakan platform digital sesuai dengan domain pekerjaan yaitu :

1. Sales Force
2. Agent Platform
3. CNV & Verifyone Platform
4. LMS Insurance Platform
5. LMS Fund Platform
6. LMS Core Platform
7. DMS Platform
8. Website Digital
9. MyBRO
10. MySys
11. CMS
12. SMART
13. IMS
14. Incentive

G. Business Process Bravo PBF

Berikut adalah gambaran bisnis proses Bravo PBF

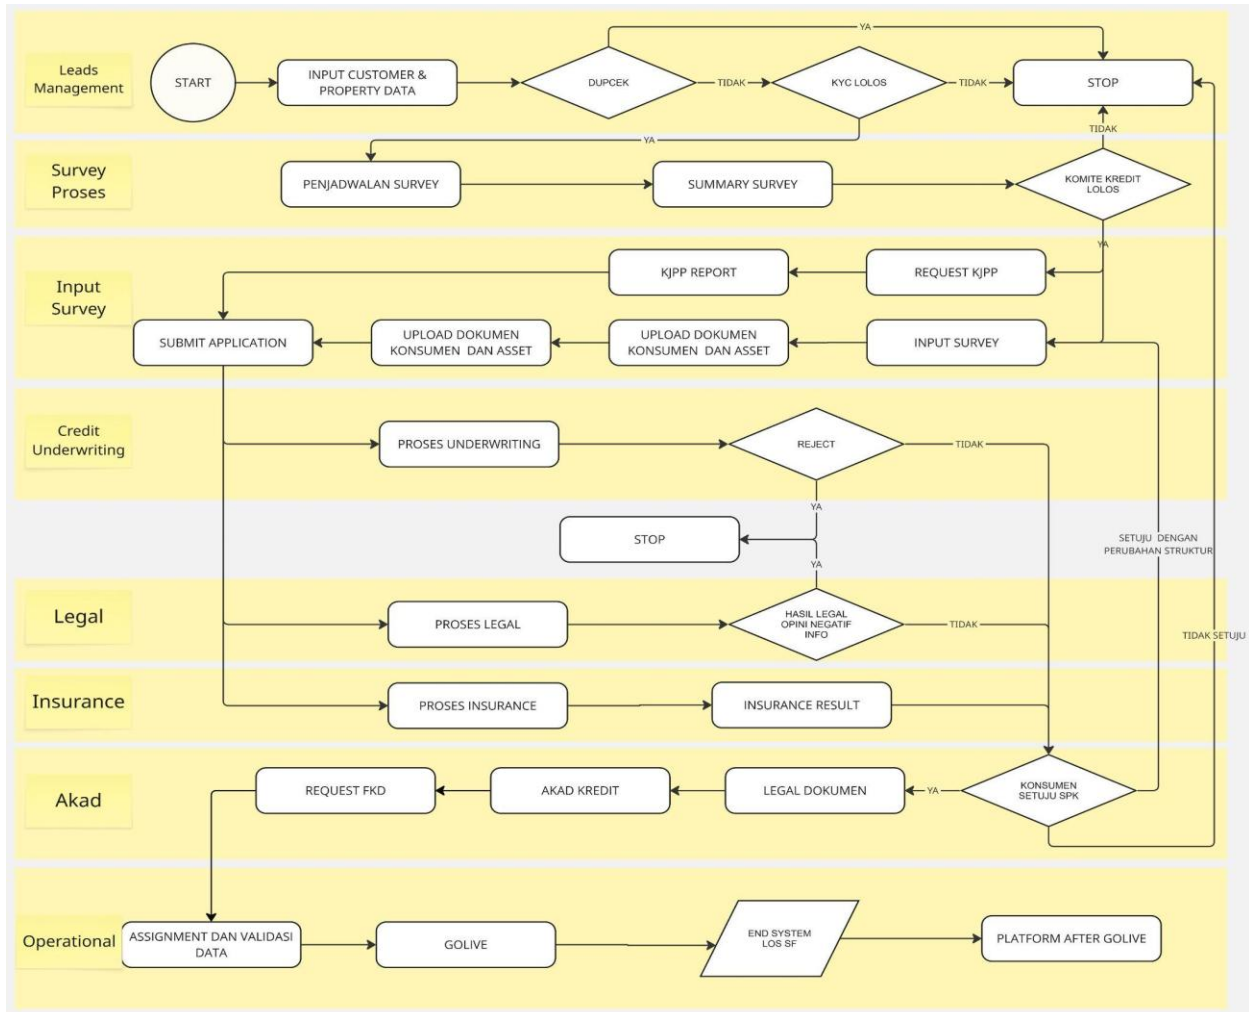

Penjelasan flow bisnis project bravo PBF

I. Leads Management

1. Direct Selling dilakukan input oleh BRO/AO/SPV di salesforce,
2. RO dan Digital diinput oleh tele RO dan tele marketing di salesforce dengan menggunakan login masing-masing pada MVP 1, dan proses terintegrasi salesforce dengan Platform RO (Mybro) dan Tele (Mysis) akan dilakukan pada MVP 2
3. Agency akan dilakukan input leads di salesforce pada MVP 1, dengan referral ID Agent terdaftar di agent platform, integrasi leads pada agent platform akan dilakukan pada MVP 2 selanjutnya

4. CNO akan diimplementasikan pada MVP 2
5. Proses leads management mencakup proses dup-check internal salesforce, pengiriman customer consent untuk KYC dan penarikan Pefindo melalui CNV/ Verifyone sampai dengan perubahan status menjadi convert leads
6. Namun jika terjadi kendala inputan leads dari semua SOA dan PIC di atas, maka akan dilakukan process input ulang pada confines.

II. Proses Survey

1. Penjadwalan survey yang dilakukan oleh AO
2. Pelaksanaan survey oleh beberapa PIC yang terlibat baik dari pihak cabang maupun Head office
3. Melakukan analisa informasi yang didapatkan dari hasil survey oleh AO, dan melakukan rekomendasi dari hasil survey dengan pilihan
 - Input survey, untuk melanjutkan pada proses input hasil survey untuk dilakukan approval review
 - Negatif Info, mendapatkan informasi yang negatif baik dari profile, lingkungan, asset jaminan yang mengakibatkan proses tidak dilanjutkan
 - Lost Deal, tidak terjadi kesepakatan baik struktur pembiayaan maupun tujuan pembiayaan
4. Cabang melakukan komite kredit yang dilakukan oleh AO, SPV, CA, Legal dan BM untuk memutuskan proses dilanjutkan atau tidak dilanjutkan berdasarkan hasil dari informasi survey

III. Input Survey

1. Proses akan dilanjutkan oleh AO dengan melengkapi data dan inputan survey serta dokumen yang mencakup ;
 - Profil debitur baik personal atau company
 - Marital status untuk profile debitur dan Management in charge untuk company
 - Detail penilaian asset yang menjadi jaminan
 - Pemilihan POT dan Struktur pembiayaan serta request NST Pricing
 - Perhitungan capacity baik personal maupun company
 - Proses upload document personal maupun asset
 - Proses request pengecekan SKPT sertifikat
2. Submit aplikasi kepada Credit, legal dan insurance secara paralel untuk dapat dilakukan analisa dan proses selanjutnya

IV. Proses Review Credit*

1. Credit melakukan melakukan analisa credit dalam bentuk 1P 5C sesuai dengan struktur pembiayaan yang dipilih dan RAC dari POT yang dipilih
2. Pemilihan NST Risk dan melanjutkan proses review sesuai dengan empowerment NST serta CAA
3. Selama proses review credit dapat dilakukan return aplikasi ke AO untuk update informasi dan perubahan struktur sesuai kondisi review aplikasi
4. Melakukan proses approval sesuai kewenangan serta memberikan syarat pembiayaan dan TC credit.
5. Apabila aplikasi reject dalam proses approval normal maka akan dilanjutkan dengan mekanisme appeal. Secara system akan dikirimkan kepada PIC yang akan melakukan appeal sesuai kewenangan.

*: Catatan

- Implementasi MVP 1 tidak terdapat Activities Enhancement dalam proses inputan Credit Review, dimana beberapa field inputan belum tersedia di platform credit review.
- Enhancement akan dilakukan di Q4 dengan field yang dapat diakses pada link berikut:
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1imwMVU7EcUguh24QV7UZ9efkMKOApSxj-2Mx-oJtqEw/edit?gid=1729297253#gid=1729297253>

V. Proses Legal

1. AO melakukan request pembuatan legal opini yang merupakan proses pemeriksaan dan analisa dokumen yang telah diupload oleh AO pada menu survey
2. LAO akan melakukan review legal opini mencakup
 - informasi pribadi konsumen baik customer type personal maupun company
 - Dokumen pribadi debitur maupun dokumen jaminan
 - Akta ataupun dokumen lain yang berhubungan dengan debitur company,
3. LAO akan submit kepada Legal PBF Head untuk dilakukan approval atas legal opini
4. LAO akan mengirimkan secara system legal opini tersebut kepada AO untuk diketahui dan ditindaklanjuti
5. AO akan menindaklanjuti hasil legal opini pada system yang menjadi syarat untuk dilakukan akad kredit
6. AO akan Request dokumen legal untuk selanjutnya LAO akan mempersiapkan Legal dokumen.

VI. Proses Insurance

1. Proses insurance meliputi SPAJK dan Asuransi Asset.
2. Request SPAJK dilakukan, dengan ketentuan konsumen telah menandatangani form SPAJK dan dokumen tersebut telah upload oleh AO di system, sedangkan asuransi asset akan mengikuti berdasarkan kelas konstruksi
3. Proses submit dilakukan oleh AO, sehingga SPAJK sudah dapat diproses dengan output berupa putusan SPAJK oleh Asuransi Rekanan dengan bentuk Cover note
4. Output dari proses asuransi adalah
 - Premi Asuransi Normal
 - Premi Asuransi disertai dengan extra premi
 - Uninsured

VII. Proses Akad

1. Offering letter / SPK dilakukan generate pada system oleh AO, untuk selanjutnya dikirim dan diinformasikan kepada konsumen untuk mendapat persetujuan dari konsumen.
2. AO menerima feedback dari konsumen dengan memiliki 3 kondisi
 - Konsumen setuju, proses selanjutnya akan dipersiapkan akad
 - Konsumen ingin perubahan TC atau struktur, proses selanjutnya akan dilakukan return aplikasi
 - Konsumen tidak setuju, proses drop aplikasi
3. AO akan generate dokumen akad yang telah dilakukan review oleh legal dan request tanggal akad kepada legal
4. Akad dilaksanakan dengan dokumen dokumen akad yang telah ditandatangani debitur akan diupload oleh AO di system untuk validasi data golive oleh CCO
5. AO akan melakukan request Form Kelengkapan Dokumen Marketing dan Legal untuk dilakukan validasi dokumen oleh marketing dan credit HO atau Legal HO
6. Marketing atau credit dan legal HO melakukan approval FKD untuk selanjutnya divalidasi oleh CCO sebagai dasar golive selain dokumen akad

VIII. Proses Golive dan Pencairan

1. CCO akan menerima dokumen after akad dan FKD sebagai kelengkapan golive.
2. Melakukan input prior to golive, sesuai dengan struktur split pembiayaan, dan TC yang telah di approve
3. Melakukan golive aplikasi di R3 dan penampungan dana hold dan TC dalam platform LMS Fund dan LMS Core

IX. After Golive

1. Process account maintenance, open-close kasir, contract inquiry dan lain sebagainya dilakukan pada platform LMS & DMS dengan list proses sebagai berikut:

LMS Core

- Contract Activation
- Journal (Setting , Integration)
- Agreement Inquiry (Agreement Detail, Payment History)
- Prepaid Settlement (Request, Approve)
- Early Termination (Request, Approve, Execute)
- Change Due Date (Request, Approve, Execute)

LMS Fund

- Disbursement Manual
- Disbursement H2H (CIMB, MANDIRI, BRI, BCA)
- Payment receives manual (cash, transfer)
- Payment receives PP (kecuali Permata, GPK, GOTO DDE)
- Auto reconcile PP
- Payment Receive Autodebet dan Reconcile AutoDebet (BRI, BCA)
- Payment received in transit
- Prepaid allocation
- Refund to customers
- Collector Receives
- Open Close Cashier (Open)

LMS Insurance:

- Santunan Insurance - Calculation & Activation
- Santunan Insurance - Generate SPPA
- Santunan Insurance - Billing & Request Payment
- Santunan Insurance - Claim process
- Life Insurance - Approval SPAJK
- Life Insurance - Calculation & Activation
- Life Insurance - Generate SPPA
- Life Insurance - Billing & Request Payment
- Life Insurance - Claim process
- Life Insurance - Termination
- Assets Insurance - Calculation & Activation
- Assets Insurance - Generate SPPA
- Assets Insurance - Billing & Request Payment
- Assets Insurance - Termination

DMS

- Customer Document
- Receive Document After Golive
- Sent Branch to Centro

- Sent document centro to custody
- Request Relocation Borrow
- Asset Document Borrow
- Request relocation release
- Asset Document Release

X. Collection Activity

1. Seluruh proses collection di lakukan di dalam sistem CMS, SMART Mobile & IMS:
 - a. CMS
 - i. Setting Wilayah Tagih
 - ii. Print SP & SPPU
 - iii. Process RAL (request approve, print, inquiry)
 - iv. Repossesion
 - v. All Existing Feature CMS
 - b. SMART Mobile
 - i. Payment (Collector Receive)
 - ii. All Existing Feature SMC
 - c. IMS
 - i. Inventory Process
2. System collection yang disebutkan pada point 1, akan merujuk pada contract yang sudah dilakukan migration ke R3, dimana contract tersebut akan di handling oleh cabang PBF terdekat berdasarkan wilayah zipcode/kelurahan residence konsumen

H. Ketentuan Lainnya

1. Memo ini berlaku dari tanggal implementasi sampai dengan implementasi MVP berakhir atau terdapat perubahan atau update yang akan menggantikan memo ini
2. Ketentuan lainnya yang tidak diatur dalam SK ini, mengikuti ketentuan terkait yang berlaku.
3. Berlaku secara bertahap hanya untuk Cabang yang ditunjuk sesuai dengan timeline implementasi project
4. Project ini dilakukan review secara berkala

Demikian Memo ini dibuat, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Diajukan Oleh	
	Approved by Email (29/09/25)
Praditta Syifa Desvi	Evi Kristiana

Pihak yang Terlibat			
Approved by Email (01/10/25)	Approved by Email (01/10/25)	Approved by Email (01/10/25)	Approved by Email (02/10/25)
Riko Armanda	Hariman Nugraha	Syamsi Kusyanti	Kwan Sun An Antony
Approved by Email (02/10/25)	Approved by Email (01/10/25)	Approved by Email (01/10/25)	Approved by Email (29/09/25)
Desliana Sidabutar	Lisa Gunawan	Tania Febrina	Donny Patrick Manik
Approved by Email with notes* (29/09/25)	Approved by Email (29/09/25)		
Aldo Susanto	Lim Rudi		

*Sebagai catatan karena collection sudah menerapkan collection zoning yang mana penanganan kontrak dilakukan berdasarkan domisili konsumen terdekat dari cabang BFI, maka meskipun piloting di Cabang (SCG) BSD dan Bintaro maka berpotensi tim collection BSD dan Bintaro akan handling kontrak dari bookingan cabang lain yang ada di teritory BSD dan Bintaro

Disetujui Oleh				
Rudy Eddywidjaja	Karim Siregar	Iwan	Goklas	Sudjono

